



Avancement du programme

Première composante : L'éradication des logements rudimentaires et leur substitution par des logements nouveaux

- Des conventions pour réaliser environ **10.189 logements** pour un cout de **216 millions de dinars** ont été signés.
- Nombre de logements réalisés jusqu'à fin Décembre 2023 : **7026 logements**.

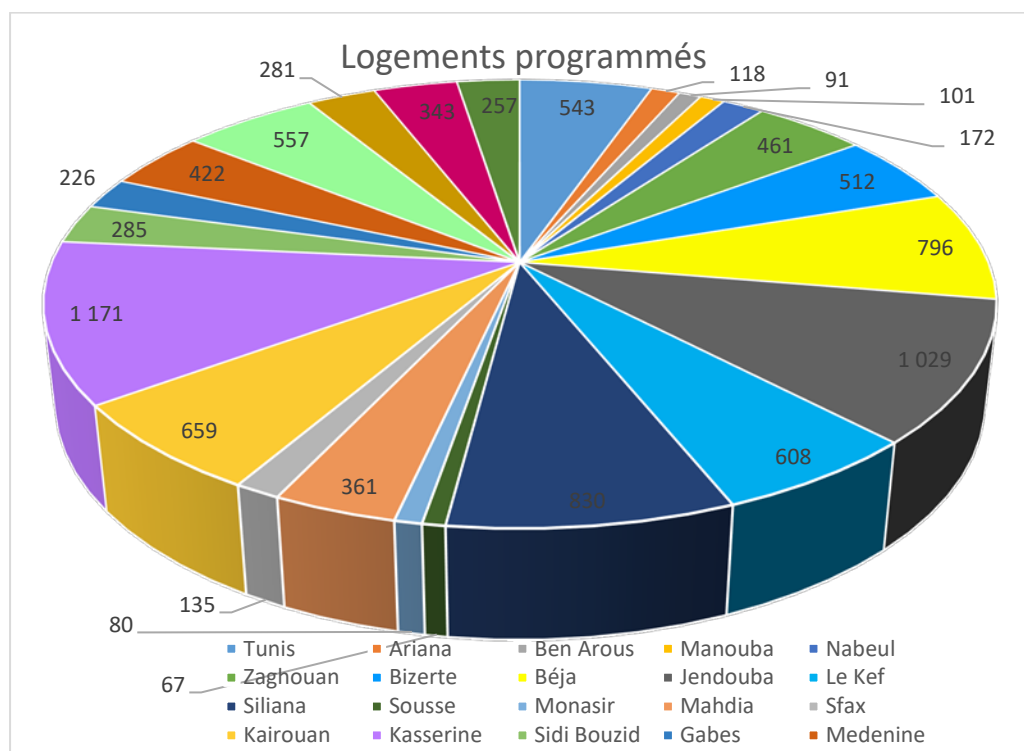

	jusqu'en 2018	jusqu'en 2019	jusqu'en 2020	jusqu'en 2021	jusqu'en 2022	jusqu'en 2023
Logements construits	3679	5247	5247	6077	6267	7026
Logement en cours d'exécution	2856	2200	2200	1559	1792	1103

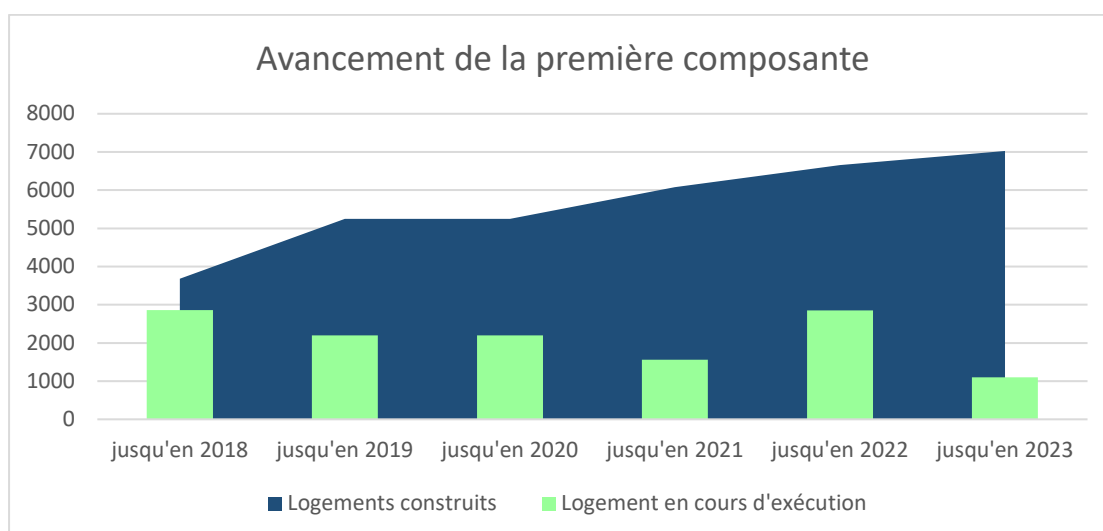

Deuxième composante : la réalisation et la dotation de logements sociaux ou l'aménagement et la mise à disposition de lotissements sociaux

Il est prévu de réaliser **13.400 logements** pour un cout de **1038 millions de dinars** ont été signés.

	jusqu'en 2018	jusqu'en 2019	jusqu'en 2020	jusqu'en 2021	jusqu'en 2022	jusqu'en 2023
Logements construits	1211	2107	2107	3634	4024	3386
Logements remis	157	189	189	726	654	1292
Logement en cours d'exécution	2225	1046	1046	4001	3694	3694

